


平成24年度行政事業レビューシート (内閣府)

事業名	独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備に必要な経費		担当部局	沖縄振興局		作成責任者		
事業開始・終了(予定)年度	平成17年度		担当課室	沖縄科学技術大学院大学企画推進室		岩井 一郎		
会計区分	一般会計		施策名					
根拠法令 (具体的な条項も記載)	沖縄振興特別措置法 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法		関係する計画、通知等	沖縄振興計画				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に基づく同法第85条第2項に規定する大学院を置く大学の設置の準備と併せて、沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する研究及び開発等を推進することにより、沖縄における科学技術に関する研究開発の基盤の整備を図り、もって沖縄の自立的発展及び世界の科学技術の発展に寄与する。							
事業概要 (5行程度以内。別添可)	独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の設置する施設(大学院大学恩納村キャンパスの研究棟等)の整備充実を図るため、機構が行う施設の整備に要する経費に対して補助を行う。 補助率:定額							
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他							
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算の状況	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度要求		
		当初予算	5,511	5,142	1,402	0	0	
		補正予算	0	0	0	0		
		繰越し等	10,302	-2,273	1,679	3,233		
	計	15,812	2,869	3,081	3,233	0		
	執行額	15,812	2,707	3,081				
執行率(%)	100%	94.40%	100%					
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	成果指標		単位	21年度	22年度	23年度	目標値(24年度)	
	大学院大学の開学に向けた研究者採用の状況			代表研究者等の数	22	29	44	50
	達成度		%	44	58	88		
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標		単位	21年度	22年度	23年度	24年度活動見込	
	大学院大学の開学に向けたキャンパスの施設整備の実績			竣工した施設数(着工した施設数)	2(0)	0(2)	2(1)	—
			(当初見込み)	() () () ()				
単位当たりコスト	615百万(円/棟)		算出根拠	615百万円=23年度竣工した施設の総工費/23年度竣工した施設数 講堂(859,050,000円)+立体駐車場(370,965,000円)/2				
平成24・25年度予算内訳	費目	24年度当初予算	25年度要求	主な増減理由				
	独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備に必要な経費	0	0	※平成23年11月に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構は廃止され、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園が設置された。これに伴い、「独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備費」を廃止し、平成24年度より「沖縄科学技術大学院大学学園施設整備費」として計上している。(当該施設費については「沖縄科学技術大学院大学学園補助金」の行政事業レビューシートに併記。)				
	計	0	0					

事業所管部局による点検			
	評価	項目	評価に関する説明
目的・予算の状況	○	広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。	
	○	国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業となっていないか。	
	—	不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。	
資金の流れ、使途・費目	○	支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。	
	○	単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	—	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
活動実績、成果実績	○	他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。	
	○	適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。	
	○	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	
	—	類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。 ※類似事業名とその所管部局・府省名	
	○	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	
点検結果	<p>事業者の選定に当たっては一般競争入札を基本としつつ、業務の内容に応じて総合評価入札方式や簡易公募型プロポーザル方式等を活用することにより、適正な執行に努めている。一方で、引き続き定期的に遂行状況報告を受けるなど、工事の進捗状況の把握に努めていく必要がある。</p>		
予算監視・効率化チームの所見			
現状通り	<p>今後の関係施策の推進に資するよう、事業の成果について適切に検証すべき。</p>		
上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点(概算要求における反映状況等)			
現状通り	<p>学園に対して、毎年度の取組、指標、実績等について提出させることとしている。平成24年7月に外部有識者からなる「沖縄科学技術大学院大学学園に関する有識者懇談会」を設置し、事業の成果についても議論されている。今後とも事業の成果の評価・検証を適切に実施していきたい。</p>		
補記（過去に事業仕分け・提言型政策仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）			
関連する過去のレビューシートの事業番号			
平成22年行政事業レビュー	98	平成23年行政事業レビュー	100

※平成23年度実績を記入

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を
行っているか
について補足
する)(単
位:百万円)

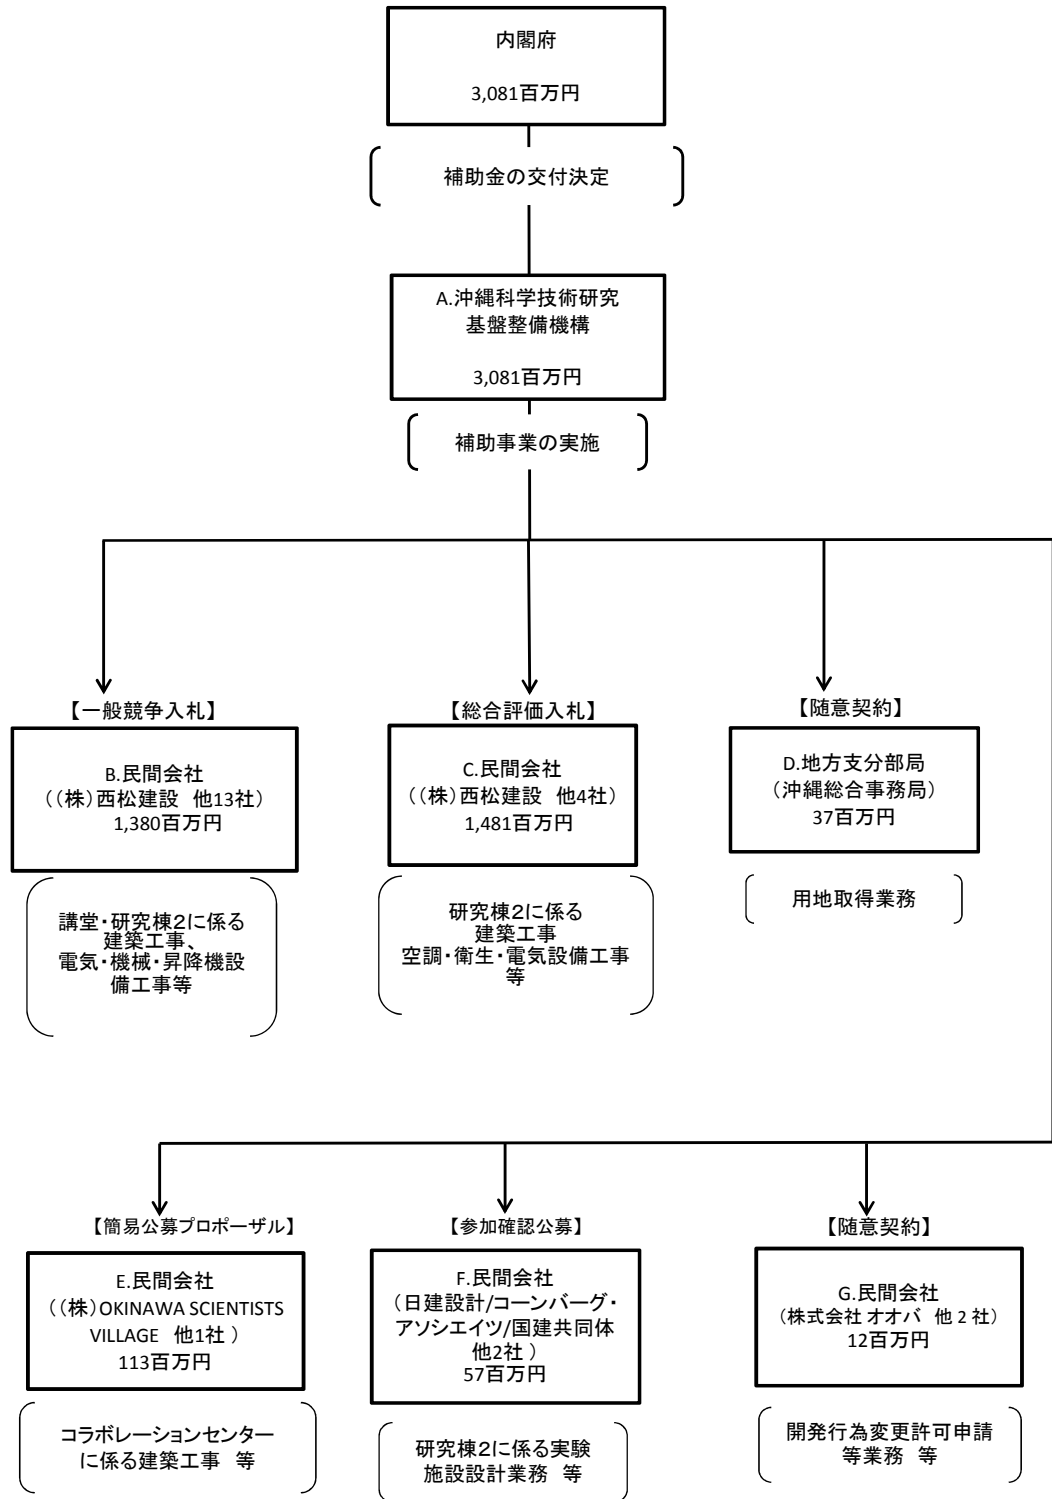

A.			E.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
工事費	研究棟2関連	1,590	不動産購入費	コラボレーションセンター建築工事	104
工事費	基幹・環境整備関連	913			
工事費	講堂関連	474			
不動産購入費	コラボレーションセンター建築工事	104			
計		3,081	計		104
B.			F.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
建築工事費	研究棟2新営工事	423	建築工事費	研究棟2(A階他)実験施設等設計業務	34
計		423	計		34
C.			G.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
建築工事費	研究棟2新営工事	471	附帯事務費	開発行為変更許可申請等業務(平成23年度)	9
計		471	計		9
D.			H.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
用地買収費	大学院大学メインアクセス周辺用地取得業務	37			
計		37	計		0

費目・使途
 (「資金の流れ」
 においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載)

支出先上位10者リスト

B.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	西松建設株式会社	研究棟2新営建築工事	423	1	99.80%
2	東洋建設株式会社	講堂新営建築工事	305	7	92.70%
3	東光・ヤンマー沖縄特定建設 工事共同企業体	基幹・環境整備(発電設備設置)工事	168	5	75.60%
4	有限会社 許田組	基幹・環境整備(道路埋設配管)工事	160	15	84.20%
5	合資会社 平安名組	基幹・環境整備(共同溝)工事	76	46	96.60%
6	高砂熱学工事株式会社	基幹・環境整備(講堂排煙設備)工事	71	10	88.80%
7	東光電気工事株式会社	講堂新営電気設備工事	66	14	97.70%
8	沖縄東芝エレベータ株式会社	研究棟2新営エレベータ工事	33	4	77.20%
9	有限会社 日向工業	基幹・環境整備(給水設備)工事	26	4	77.10%
10	沖縄菱電ビルシステム株式会社	講堂新営昇降機設備工事	22	4	80.30%

C.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	西松建設株式会社	研究棟2新営建築工事	471	5	66.00%
2	(株)國場組・綿半テクノス (株)特定建設工事共同企 業体	基幹環境整備(立体駐車場)工事	371	5	88.90%
3	新菱冷熱工業株式会社	研究棟2等新営機械設備工事	367	4	83.20%
4	東光電気工事株式会社	研究棟2等新営電気設備工事	263	4	97.10%
5	沖縄科学技術大学院大学土木 工事監督支援業務(平成23年 度)株式会社日建設シビル・ 株式会社日建設計共同体	土木工事監督支援業務(平成23年度)	9	1	99.20%

D.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	内閣府沖縄総合事務局	大学院大学メインアクセス周辺用地取得業務	37	—	—

E.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)OKINAWA SCIENTISTS VILLAGE	コラボレーションセンター建築工事	104	1	98.15%
2	日建設計・国建共同体	講堂新営等に係る工事監理業務	9	1	96.10%

F.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	日建設計/コーンバーク・アソ シエイツ/国建共同体	研究棟2(A階他)実験施設等設計業務	34	1	99.70%
2	日建設計/コーンバーク・アソ シエイツ/国建共同体	設計費/インフラ等(6工区他)設計業務	21	1	98.00%
3	日建設計/コーンバーク・アソ シエイツ/国建共同体	講堂新営等実施設計業務(その4)	2	1	97.80%

G.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	株式会社 オオバ	開発行為変更許可申請等業務(平成23年度)	9	随意契約	99.00%
2	合資会社 平安名組	法面崩落部補修工事(C-01棟 東)	2	随意契約	100.00%
3	合資会社 平安名組	法面崩落部補修工事(A-07棟 東)	1	随意契約	100.00%
